

**Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025
w roku 2019**

Rodzaj sprawozdania: roczne

Okres sprawozdania: 01.01.2019 – 31.12.2019

Informacje ogólne

Numer sprawozdania	RW.0643.1.2020
Data sporządzenia sprawozdania	21.01.2020
	Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

Osoba sporządzająca sprawozdanie	Referent w Biurze ds. Rewitalizacji
Imię i nazwisko	Krystyna Florczak
Telefon kontaktowy	46 814 47 11 (wew. 130)
E-mail	krystyna.florczak@miastorawa.pl

Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu. Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.

- Zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których realizacja została zakończona w 2017 i 2018 roku.
- Zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została zakończona w 2019 roku.
- Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.
- Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w po 2019 r.
- Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Programie.

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez Wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz wypełnionych przez inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu procesu rewitalizacji.

Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Lp	Nazwa projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny
2	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
3	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
4	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5	Rawa Gra dla Wszystkich
6	Pomóż Innym i Sobie
7	W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8	Rawscy Skauci jak Zawisza
9	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10	Bycie EKO Się Opłaca
11	Program Aktywizacja i Integracja
12	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany przez oraz Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny”

zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, uległy wartości docelowe, które zostały przedstawione w raporcie z monitoringu.

W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowany przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana w zeszłorocznym sprawozdaniu.

I Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych:

1. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
2. Program Aktywizacja i Integracja

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	300 000,00 zł	Główny cel to wzrost aktywności oraz profesjonalizacja działań rawskich organizacji pozarządowych
2	Program Aktywizacja i Integracja	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej	20 000,00 zł	Główny cel to pomoc osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej we właściwym funkcjonowaniu w środowisku społecznym

1. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych daje organizacjom społecznym i grupom nieformalnym możliwość działania na rzecz mieszkańców miasta bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym. Jest miejscem, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz mieszkańców, mogą pracować wspólnie. W ramach oferty mogą być również przeprowadzane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- oficjalne otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - 11 stycznia 2019 r.
- podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi (INSPRO) prowadzącym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centrum KLUCZ w zakresie m.in. środowiska przyjaznego ekonomii społecznej poprzez działania skierowane do organizacji pozarządowych - 25.02.2019 r.
- Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej - 27 marca 2019 r.
- realizacja projektu pt. „W Rawie Mazowieckiej śpiewać każdy może” we współpracy ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, polegająca na utworzeniu chóru - marzec - grudzień 2019 r.
- Festyn Organizacji Pozarządowych Radosne Święto - 3 maja 2019 r.
- szkolenie pt. „Jak pisać projekty, które wygrywają?” - 22 i 23 maja 2019 r.
- konsultacje dotyczące projektów przygotowanych przez organizacje pozarządowe - 4 i 25 czerwca 2019 r.
- spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty” Łódzkie na Plus” 2019 - 25.09.2019 r.
- szkolenie pt. „Rozliczenie dotacji za rok 2019 na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie” - 5 listopada 2019 r.

- spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO edycja 2020 - 28 listopada 2019 r.
- szkolenie: Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań - 3 grudnia 2019 r.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	1 szt.	1 szt.
Powierzchnia wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń pod działalność centrum	70 m ²	22 m ²
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z centrum	20	24

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Centrum jest mniejsza od zakładanej. W zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie większej powierzchni skutkowałaby natomiast wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie konieczności przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe jest nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	12 756,75 zł	Budżet Miasta	20 000,00 zł	12 756,75 zł

2. Program Aktywizacja i Integracja

W okresie od 6. maja do 28. czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja. Obejmował on dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną.

Aktywizacja zawodowa polegała na wykonywaniu przez uczestników Programu prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Prace te realizowano na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących jednostkach: Żłobek Miejski Tuptuś, Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Muzeum Ziemi Rawskiej, MOPS, RAWiK, OSiR. Integracja społeczna obejmowała cykl zajęć warsztatowych, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni.

Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba godzin przepracowanych w formie prac społecznie użytecznych (blok aktywizacja) (planowany na rok 2018 i 2019)	80 godzin prac społecznie użytecznych przypadające na każdego uczestnika	800 godzin prac społecznie użytecznych (10 osób x 10 godzin tygodniowo x 8 tygodni)
Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz warsztatów trenerskich z psychologiem i doradcą zawodowym (planowany na rok 2018 i 2019)	80 godzin poradnictwa i warsztatów przypadające na każdego uczestnika	800 godzin poradnictwa i warsztatów w 2018r (10 osób x 10 godzin tygodniowo x 8 tygodni)
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	1	1
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	6	10
Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po opuszczeniu programu : - uzyskały kwalifikacje - podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	1 1	3 0

Przez cały czas trwania realizacji LPR prowadzony będzie monitoring dot. zatrudnienia. Osoby z obszaru rewitalizacji mogą podjąć pracę na przestrzeni kolejnych lat.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Projekt Aktywizacja Integracja	9 590,30 zł	Refundacja kosztów prac społecznie użytecznych z PUP	4 032,00 zł	4 032,00 zł
		Środki własne gminy	5 558,30 zł	5 558,30 zł

II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
3. Rawscy Skauci jak Zawisza
4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej	700 000,00 zł	Głównym celem jest poprawa dostępu do oferty edukacyjnej dla uczniów
2	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	30 000 000,00 zł	Główny cel to kompleksowa rewitalizacja, skutkująca wprowadzeniem i przywróceniem na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych
3	Rawscy Skauci jak Zawisza	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	20 000,00 zł	Główny cel to kształtowanie pozytywnych wartości i postaw wśród młodzieży
4	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	50 000,00 zł	Główny cel to stworzenie sprzyjających warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla poprawy warunków mieszkaniowych

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji

Projekt w obecnym kształcie jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu było doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry. Projekt ten nie otrzymał dofinansowania. W celu dostosowania zapisów LPR dotyczących projektu do reformy edukacji zakładającej stopniowe wygaszanie gimnazjów, projekt został zmodyfikowany. W 2018 roku trzy szkoły podstawowe z terenu Rawy Mazowieckiej złożyły wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dwie szkoły- Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 przeszły pozytywnie etap oceny formalno-merytorycznej. Tylko jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 2, została zarekomendowana do dofinansowania i to w Szkole Podstawowej nr 2 jest realizowany projekt.

Szkoła realizuje projekt, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli, od 1 kwietnia 2019 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów. Równie ważne jest rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i zdobycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Duży nacisk został położony na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie tego ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedna grupa prowadzonych działań obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, np. z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i języków obcych. Druga grupa to zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii zawierające jednocześnie elementy przedsiębiorczości. W szkole działają różne koła zrzeszające, np. zainteresowanych naukami przyrodniczymi, informatyką, a także Koło Młodych Podróżników czy Inżynierów. Liczne zajęcia prowadzone są z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne czy zajęcia psychoedukacyjne. Aby sprawnie zrealizować założone cele, planuje się doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Szkoła ma być także wyposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W projekcie rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do raportu otwarcia, co zostało wskazane w raporcie z monitoringu.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	288	338
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	1	1
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	0 (w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie osiągnięta wartość 1)
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	6	24
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	60	66
Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których minimum 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne	1	0 (planuje się osiągnięcie wskaźnika w kolejnym okresie sprawozdawczym)
Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości	40	74
Liczba uczniów objętych indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	145	117
Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich	1	1

Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	230	2
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	0 (w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie osiągnięta wartość 1)
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	0 (w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie osiągnięta wartość 1)
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	48	76

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Wykluczamy Wykluczenie- wysoka jakość edukacji	430 394,71 zł	Dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020 Środki własne	751 111,02 zł 45 000,00 zł	390 794,71 zł 39 600,00 zł

2. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi.

a. *adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej*

Jatki miejskie to zabytkowy budynek wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby straży pożarnej. Potem budynek służył głównie celom handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również znacznie zniszczony podczas II wojny światowej. Efektem tych zmian jest inny od pierwotnego układ wnętrza oraz zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. Budynek poddawany jest kompleksowemu pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. Remont i rozbudowa obiektu pozwoli na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. Jatki odzyskają także swój klasycyzujący charakter. Powierzchnia budynku ulegnie podwojeniu dzięki zaplanowanej rozbudowie obiektu o nowy budynek. Nowy budynek będzie miał kubaturę i kształt zbliżone do starego. Nowa część zostanie połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. Przebudowany obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i rozbudowany budynek stanie się częścią rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej części powstanie ekspozycja stała poświęcona historycznej roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej części zostanie przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej oraz ekspozycja zbiorów etnograficznych. W szklanym łączniku zostanie utworzone Rawskie Centrum Integracji Kulturalnej.

Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

Zabytkowy budynek jatek:

- wykonano izolacje pionowe i poziome fundamentów wraz z podbiciami,
- wykonano warstwy posadzkowe,
- wykonano nadproża i docieplenie ścian od środka,
- wymieniono i wzmocniono więźbę dachową wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu,
- wykonano remont elewacji i przyległego ogrodzenia,
- wykonano stolarkę okienną,
- trwają prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i sanitarnej.

Nowy budynek jatek:

- wzniesiono cały budynek wraz z więźbą dachową,
- wykonano warstwy posadzkowe piwnic i parteru,
- wykonano izolacje ścian i tynki wewnętrzne,
- wykonano stolarkę okienną,
- trwają prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i sanitarnej.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	0,08 ha	0
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1 szt	0
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	556 m ²	0
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	1 szt	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	2 336 229,36 zł	RPO Wł na lata 2014-2020	2 416 736,68 zł (na całość zadania)	743 960,14 zł
		Budżet Miasta	4 700 000,00 zł (na całość zadania)	1 592 269,22 zł

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. W budynku muzeum przeprowadzono generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX w” oraz „Gabinet numizmatyczny”.

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła się nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, aby wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu międzywojennego. Alejki parkowe otrzymały nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od Zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Prace w parku zakończono w listopadzie 2018r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu zadania zakłada się m.in. poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta oraz uatrakcyjnienie gospodarcze obszaru, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:

- wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
- uzyskano stosowne decyzje zezwalające na realizację inwestycji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi,
- uzyskano pozwolenia na budowę od Starosty Rawskiego (bez ulicy Krakowskiej),
- Sejmik Województwa Łódzkiego oraz Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyjęła uchwały, według których ulica Krakowska (droga wojewódzka nr 727) staje się drogą gminną,
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	2,75 ha	0
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	9268 m ²	0
Długość przebudowanych dróg gminnych	1,17 km	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	27 026,46 zł	RPO Wł na lata 2014-2020	9 453 591,55 zł (na całość zadania)	0 zł
		Środki własne	6 000 000,00 zł	27 026,46 zł

3. Rawscy Skauci jak Zawisza

Działania zrealizowane w ramach projektów w okresie sprawozdawczym:

1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 100 osób) styczeń – grudzień 2019
 - a. Cotygodniowe zbiórki zastępów (22 chłopców + 25 dziewcząt) oraz Gromad (15 chłopców + 20 dziewcząt)
 - b. Spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (20 osób)
 - c. Spotkanie opłatkowe 1. Szczepu Rawskiego oraz 2. Szczepu Rawskiego - 27.12.2019 (150 osób)
2. Organizacja 6 biwaków, wycieczek, udział w zlotach (dla łącznie około 60 osób), styczeń – grudzień 2019
3. Organizacja 6 wyjazdów wypoczynku letniego (dla około 50 osób) czerwiec - wrzesień 2019
4. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją, imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia (liczba uczestników od 50 do 300) styczeń – grudzień 2018
 - a. „Papieska Gra Terenowa” – gra z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, Rawa Mazowiecka, ok. 60 osób - 13.10.2019 r.
 - b. „Gra Historyczna” - gra z okazji 101-rocznicy odzyskania niepodległości, ok. 50 osób - 10.11.2019 r.
 - c. „Dzień Dziecka wg Skauta” zajęcia edukacyjne, promujące działanie na rzecz wspólnego dobra w najbliższym otoczeniu - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej, wrzesień (ok. 300 osób)
 - d. „Podwórkowa gra zręcznościowa” - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, Rawa Mazowiecka, ok. 65 osób - 21.09.2019 r.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo	126	126
Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego	10	12
Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia	3	4
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	150	300
Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	10	12
Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	1	1

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rawscy Skauci jak Zawisza	114 561,00 zł	Dotacja	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		Środki finansowe własne	13 500,00 zł	13 500,00 zł
		Wkład osobowy	83 061,00 zł	83 061,00 zł

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

W 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały następującą formę: ankieta internetowa, punkty konsultacyjne w trzech komórkach organizacyjnych urzędu oraz spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji w celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez Miasto w celu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na tym obszarze.

Po analizie ankiety i wyciągnięciu wniosków ze spotkań z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, stworzono propozycje instrumentów i narzędzi, które Miasto wprowadza od 2019 roku. Instrumenty te zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019.

Instrumenty pomocowe finansowe i pozafinansowe, które będą realizowane w ramach projektu w 2020 roku:

- opracowanie zasad konkursu na najładniejszą elewację oraz promocja konkursu - rozstrzygnięcie jest planowane do 10 grudnia 2020 r.,

- przyjęcie uchwały w zakresie zmiany stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu elewacji,
- sporządzenie planu miejscowego dla obrębu 4, który zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji
- w 2019 roku plan został uzgodniony i zaopiniowany przez instytucje, odbyły się także konsultacje społeczne z mieszkańcami przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu, co jest planowane na I kwartał 2020 r., zaś uchwalenie planu przewiduje się w 2020 r.

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku:

Wskaźniki		
Wskaźniki produktu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	1	1
Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	3	3
Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	2
Wskaźniki rezultatu	Zakładane wartości	Osiągnięte wartości
Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego	2	0

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie

W 2020 roku rozpocznie się realizacja projektu „Bycie EKO Się Opląca”

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Szacowany koszt projektu	Cele projektu
1	Bycie EKO Się Opląca	Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin	50 000,00 zł	Głównym celem jest zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży

IV Projekty uzupełniające

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i przedszkolnej

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji). W roku 2019 zakończył się drugi etap prac.

Zakres prac obejmował przebudowę i adaptację pomieszczeń szatni i łazienek. Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, glazurnicze i montażowe. Wymieniono część instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródła finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Przebudowa łazienek i szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	329 151,00 zł	Budżet Miasta	330 000,00 zł	329 151,00 zł

2. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej

Dzienny Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora prowadzony jest w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i znajduje się przy ulicy Warszawskiej 12. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16 (każdy z uczestników indywidualnie decyduje, w jakich dniach czy godzinach ma zamiar spędzić swój czas w Dziennym Domu Seniora). Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami: pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny, pomieszczenie klubowe, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputer z dostępem do internetu, pomieszczenie do zajęć aktywności ruchowej, pokój zabiegowo-pielęgniarski, łazienka, szatnia. Pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Domu Seniora jest następujący:

- usługi socjalne, w tym jeden ciepły posiłek (w formie drugiego dania),
- usługi edukacyjne, m.in. nauka obsługi komputera, spotkania i warsztaty tematyczne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczestników, treningi pamięci, wyjścia edukacyjne,
- usługi kulturalno-oświatowe, m.in. obchody świąt okolicznościowych, możliwość oglądania filmów i programów, czytanie prasy, książek, organizacja spotkań tematycznych,
- usługi sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia ruchowe (gimnastyka) mające na celu poprawę kondycji fizycznej uczestników, możliwość korzystania z urządzeń poprawiających sprawność fizyczną (rower stacjonarny, zestawy usprawniające),
- usługi terapii zajęciowej, m.in. warsztaty plastyczne, rękodzieło, zabawy przy muzyce, relaksacja,
- usługi aktywizujące społecznie m.in. spotkania integracyjne i wielopokoleniowe z podmiotami i osobami reprezentującymi różne grupy społeczne.

3. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i młodzieży

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła całoroczną opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych z obszaru rewitalizacji. Ponadto w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. następujące wydarzenia:

- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 11 do 22 lutego
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 24 czerwca do 19 lipca (5 wyjazdów jednodniowych i 1 wycieczka 3-dniowa)
- piknik rodzinny
- 2 rodzinne spotkania warsztatowe - wykonywanie dekoracji i kartek świątecznych.

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 1 w czerwcu 2019 roku zakończyło realizację projektu „Śmieci segregujemy - naszą planetę ratujemy” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto w przedszkolu prowadzona jest edukacja zdrowotna - w czerwcu 2019 r. zakończono realizację programu „Ruch to zdrowie”, z kolei we wrześniu rozpoczęto realizację programu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”.

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła na bieżąco prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży, również z obszaru rewitalizacji, działając głównie w środowisku szkolnym. W ramach projektu eTwinning współpracuje ze szkołami z różnych krajów. W poszczególnych miesiącach realizowano m.in. następujące działania:

- zajęcia z dietetykiem - luty
- debata o smogu - marzec
- w świecie matematyki fraktale - kwiecień
- listy do ziemi, DZIEŃ EUROPEJSKI - maj
- wizyta gości z Anglii w ramach Erasmus+, pokaz talentów - czerwiec
- Narodowe czytanie i Dzień głośnego czytania, Europejski Dzień Języków, Strajk klimatyczny, Szkoła z sercem-ekologiczne pomaganie - wrzesień
- udział w konkursie Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję, Dzień piżam, Mitologiczna przerwa - październik
- Tydzień kultury chrześcijańskiej - listopad
- warsztaty i kiermasz świąteczny, paczka dla kombatanta, szlachetna paczka - grudzień.

Kluby sportowe organizują zajęcia w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci zaangażowanych w sport.

4. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej

W wyniku umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Województwa Łódzkiego, Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 13 264,18 zł przeznaczone na zakup sprzętu dla rawskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na obszarze rewitalizacji. Pomoc przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w dwa komplety ubrania specjalnego strażackiego oraz suchy skafander ratowniczy z ocieplaczem.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	13 264,18 zł	Samorząd Województwa Łódzkiego	13 800,00 zł	13 264,18 zł
--	--------------	--------------------------------	--------------	--------------

5. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych

a. *Rozwój usług e-administracji*

W II kwartale 2019 roku nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wyłoniono dostawców następującego sprzętu informatycznego: drukarki, skanery oraz sprzęt serwerowy.

W III kwartale 2019 roku powtórzono ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłoniono dostawców sprzętu informatycznego, takiego jak komputery osobiste wraz z oprogramowaniem a także dostawców infrastruktury sieciowej (bez modernizacji serwerowni),

W IV kwartale 2019 roku przeprowadzono rozmowy i podpisano umowę z wolnej ręki (dwukrotnie w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta) na modernizację serwerowni.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania		
		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Rozwój usług e-administracji	452 271,03 zł	Dofinansowanie ze środków EFR	313 847,98 zł	218 275,68 zł
		Środki własne	660 000,00 zł	233 995,35 zł

b. *Projekt LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji* (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji)

Szkoła Podstawowa nr.1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, który realizuje ten projekt grantowy. Przy szkole powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. W ramach jego działalności osoby dorosłe, m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mogą skorzystać ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce wpływającej na ich rozwój. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz edukacji osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. W ramach realizacji projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku odbyły się następujące zajęcia: warsztaty rękodzieła artystycznego, szkolenie z języka angielskiego, zajęcia taneczne- latino, zajęcia muzyczne i wokalne, ćwiczenia relaksacyjne- joga, zajęcia ruchowe- fitness. Od października do końca grudnia 2019r. w ramach projektu LOWE odbywały się następujące zajęcia: język angielski, ćwiczenia relaksacyjne- joga, trzymaj formę - fitness, zajęcia taneczne - latino.

c. Program szczepień przeciwko grypie

Jesienią 2019 prowadzone były **bezpłatne szczepienia przeciw grypie**. Mogli z nich skorzystać mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia, gdyż właśnie te osoby są szczególnie narażone na powikłania pogrypowe, także z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali. Szczepienia odbywały się w następujących zakładach opieki zdrowotnej: NZOZ Raw-Medica, Centrum Medyczne Verbena, Przychodnia Lekarska REMEDIUM, Przychodnia MEDINCOM, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ogółem zaszczepiono 629 osób, w tym 170 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Całkowity koszt szczepień wyniósł 24 531 zł. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 187 osób, w tym 18 w przychodniach na obszarze rewitalizacji.

6. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło

Program CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą ochronić środowisko, a gospodarstwom domowym przyniosą oszczędności finansowe. W 2019 roku Program był skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub nowobudowanych budynków jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program CZYSTE POWIETRZE jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcję informacyjno- edukacyjną na temat przedmiotowego Programu. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci, których budynki są usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Mieszkańcom zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym mogą wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają także w wypełnieniu wniosku.

7. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub gospodarczych

Remont targowiska miejskiego

Działania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym (z podaniem okresów ich realizacji):

- 06.03.2019 r. – 08.07.2019 r. – wykonanie dokumentacji technicznej,
- 27.06.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego,
- 17.07.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
- 12.08.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę,
- 04.11.2019 r. – zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
- 04.11.2019 r. – zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru archeologicznego,
- 12.11.2019 r. – zawarcie umowy na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych.

Postęp finansowy:

Nazwa projektu	Suma kosztów realizacji w okresie sprawozdawczym	Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania

		Źródło finansowania	Planowane środki na realizację zadania	Środki poniesione w okresie sprawozdawczym
Remont targowiska miejskiego	516 627,65 zł	PROW na lata 2014-2020	995 184,00 zł (na całe zadanie)	0,00 zł
		Budżet Miasta	1 292 765,00 zł (na całe zadanie)	516 627,65 zł

8. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędnych do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji

a. *Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP*

W 2019 roku zakończyła się realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” dofinansowanego m.in. z RPO WŁ i Ministerstwa Kultury. W wyniku realizacji projektu został wykonany generalny remont świątyni oraz kolegium pojezuickiego. Zostało także utworzone Centrum Spotkań i Dialogu, w ramach którego jest prowadzona działalność o charakterze kulturalnym i prospołecznym, m.in.: spotkania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty rękodzieła, plastyczne, malarskie i inne. Ponadto odbywają się spotkania o charakterze edukacyjnym, w tym promocja czytelnictwa (realizowane wspólnie z Biblioteką Miejską) a także są organizowane pikniki i koncerty.

b. *Prace przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP*

W 2019 roku były kontynuowane roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz prace związane z nawierzchnią przy budynku kościoła. Podjęte działania pozwolą na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od kościoła zapobiegając jego zawilgoceniu oraz na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół niego.

Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania



Podczas realizacji zadania polegającego na adaptacji jatek miejskich, napotkane trudności wynikały z niskiego tempa prowadzonych robót budowlanych oraz z konieczności wprowadzenia dodatkowych prac nieobjętych dokumentacją projektową a koniecznych do wykonania. Sytuację skomplikowała dodatkowo awaria wodociągowa. Wszystkie te czynniki wpłynęły na opóźnienie terminu realizacji zadania.

W zadaniu dotyczącym zagospodarowania przestrzeni publicznej problemem okazało się opóźnienie w zmianie własności ulicy Krakowskiej oraz przedłużona procedura uzyskania pozwolenia na budowę w WUOZ w Łodzi.

Trudności wystąpiły także przy realizacji projektu uzupełniającego, jakim jest przebudowa targowiska miejskiego. W 4 ogłoszonych przetargach nieograniczonych nie pojawiły się żadne oferty, natomiast oferta złożona w piątym przetargu przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. Konieczność wprowadzenia oszczędności spowodowała z kolei zmianę systemu realizacji inwestycji z „projektuj i buduj” na oddzielne wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Podsumowanie sprawozdania

Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono się tylko do projektów podstawowych.

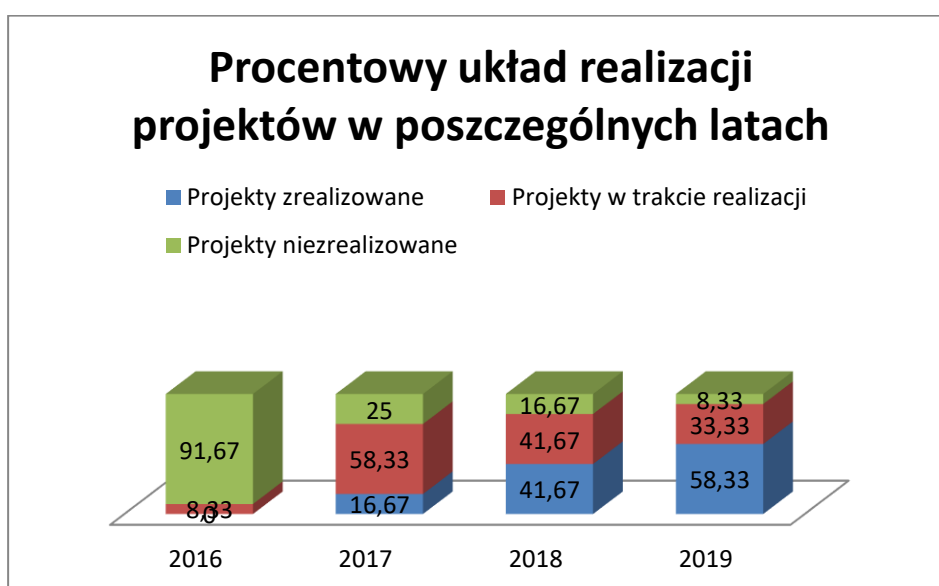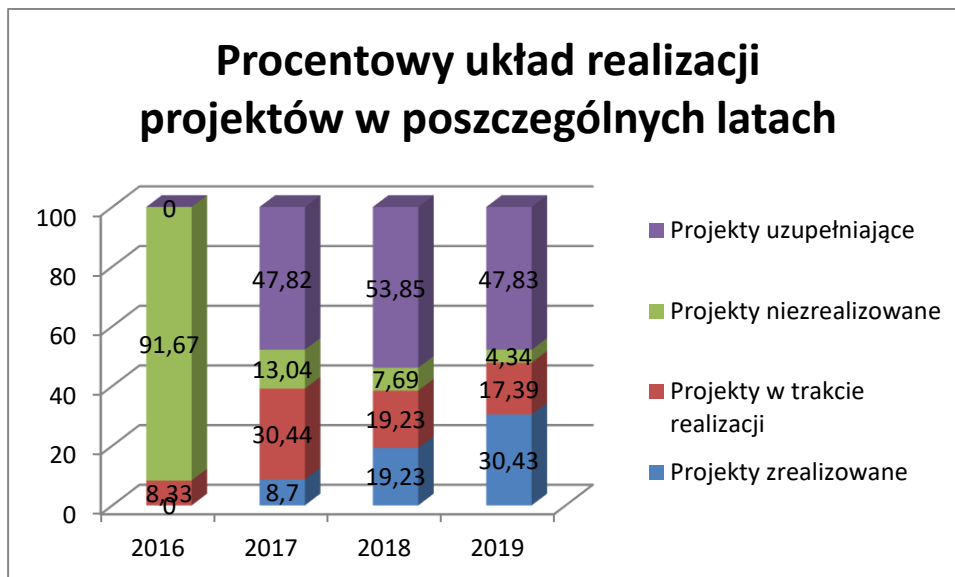

Po trzech latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 7 podstawowych projektów rewitalizacyjnych:

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny
- W „Tęczowej Jedyńce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
- Rawa Gra dla Wszystkich
- Pomóż Innym i Sobie
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
- Program Aktywizacja i Integracja.

Stanowi to nieco ponad połowę z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów podstawowych. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty są projektami o charakterze społecznym. Podejmowane w ramach ich realizacji działania były skierowane do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zarówno z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego. Ich adresatami były osoby ze wszystkich grup wiekowych.

Obecnie w trakcie realizacji są 4 następujące projekty:

- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
- Rawscy Skauci jak Zawisza
- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych.

Dwa pierwsze również są projektami o charakterze społecznym.

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Dwa z nich- „Remont Muzeum Ziemi Rawskiej” oraz „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego”, zostały już zakończone.

Realizacja ostatniego z projektów podstawowych - „ Bycie EKO się opłaca”, rozpocznie się w 2020 roku.

Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W porównaniu do zeszłego okresu sprawozdawczego zmniejszyła się ilość projektów uzupełniających, z 14 realizowanych w 2018 roku do 11 prowadzonych w roku 2019. Działania prowadzone w ramach wdrażania procesu rewitalizacji w Mieście Rawa Mazowiecka są na bieżąco przedstawiane i konsultowane z Zespołem Zadaniowym oraz z Zespołem Konsultacyjnym do spraw Rewitalizacji. W celu kierowania działań informacyjnych do mieszkańców miasta, którzy są ważnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, działa strona www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, na której mieszkańcy mogą zapoznać się z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.

Wszystkie projekty rewitalizacyjne mają charakter kompleksowy, dopełniają się wzajemnie i wywierają pozytywny wpływ na obszar rewitalizacji i całe miasto.
