

**Raport z monitoringu
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016- 2025**



Urząd Miasta Rawa Mazowiecka



za lata 2016-2018

**Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025**

Rodzaj sprawozdania: raport z monitoringu

Okres sprawozdania: 2016 -2018

Informacje ogólne

Data sporządzenia raportu	12.11.2019
Jednostka sporządzająca	Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Dane osoby przygotowującej sprawozdanie

Osoba sporządzająca sprawozdanie	Referent w Biurze ds. Rewitalizacji
Imię i nazwisko	Krystyna Florczak
Telefon kontaktowy	46 814 47 11 (wew. 130)
E-mail	krystyna.florczak@miastorawa.pl

Wstęp

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przyjęty został uchwałą nr XIX/135/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr XXI/155/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r. Program stanowi podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych, które mają wyprowadzić miasto ze zidentyfikowanego stanu kryzysowego, skoncentrowanego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Swoim zakresem obejmuje nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również działania społeczne na rzecz mieszkańców, zapewniając w ten sposób wzrost poziomu tożsamości społeczności lokalnej. LPRMRM 2025 spełnia kryteria kompletności, kompleksowości, koncentracji oraz komplementarności działań a także realizuje zasadę partnerstwa i partycypacji w procesie rewitalizacji miasta. Program jest zbieżny ze strategicznymi dokumentami miasta Rawa Mazowiecka, m.in. ze Strategią Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. Wykazuje ponadto zgodność z dokumentami zewnętrznymi, m.in. z programem opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019. Obszar rewitalizacji został określony w oparciu o analizę sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej miasta Rawa Mazowiecka. Zdiagnozowano następujące problemy występujące w poszczególnych sferach.

W sferze społecznej w szczególności zidentyfikowano:

- wysoki poziom uzależnienia od pomocy społecznej,
- wzrost liczby rodzin, w których występują problemy z prawidłowym wypełnianiem ról społecznych,
- stosunkowo duża liczba osób niepełnosprawnych,
- wykluczenie społeczne związane z długotrwałym bezrobociem,
- wysokie bezrobocie wśród osób młodych,
- mała aktywność społeczna mieszkańców miasta,
- niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W sferze gospodarczej zidentyfikowano przede wszystkim:

- duża rotacja przedsiębiorstw w centrum miasta świadcząca o krótkim okresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obecnej przestrzeni śródmiejskiej.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej najistotniejszymi zjawiskami, jakie zidentyfikowano są:

- zabudowa mieszkaniowa słabej jakości oraz niska jakość przestrzeni publicznej, jak również brak ładu przestrzennego skutkującego zbyt małą atrakcyjnością Rawy Mazowieckiej jako miejsca pracy i zamieszkania,
- niedostosowanie architektury i przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W sferze środowiskowej do problemów podstawowych zalicza się w szczególności:

- korzystanie ze źródeł ciepła niespełniających kryteriów dotyczących niskiej emisji,
- niedostateczna wiedza na temat możliwości zmiany sposobów ogrzewania oraz sposobów oszczędzania energii, np. poprzez termomodernizację i stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie.

W Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 z 2017r. określono wskaźniki produktu i rezultatu dla każdego z projektów podstawowych wraz z określeniem wartości bazowych i docelowych, które są uwzględnione w większości również w niniejszym raporcie. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, rzeczowych efektów podjętych działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują one wszystkie te produkty, które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania środków. Wskaźniki rezultatu z kolei odpowiadają efektom realizacji projektu mającym bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-

ekonomiczne. Dostarczają one również informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia danego projektu. Analiza danych w raporcie odnosi się również do oceny postępu rzeczowego oraz finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Za źródło danych posłużyły m.in. raporty roczne z realizacji przedsięwzięć przesyłane przez jednostki zajmujące się wdrażaniem projektów.

W ramach systemu monitorowania LPRMRM 2025 są zbierane i przetwarzane dane jakościowe i ilościowe na dwóch poziomach:

- dla obszaru rewitalizacji (dla celów rewitalizacji),
- dla całego miasta w określonych sferach.

Zarówno wskaźniki dla obszaru rewitalizacji, jak i dla całego miasta, są powiązane z cechami obszaru i celami programu rewitalizacji, których osiągnięcie ma nastąpić poprzez realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring polega na zbieraniu i przetwarzaniu danych ze statystyki publicznej, danych z miejskich i powiatowych jednostek samorządowych oraz danych pozyskanych od organizacji pozarządowych, które ujęte są w zestaw wskaźników. W obecnym raporcie zostaną uwzględnione dane za okres od 2016 do 2018 roku. W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się, wartości poszczególnych wskaźników produktu na koniec roku 2018 zostaną porównane z wartościami docelowymi, co da odpowiedź na pytanie, jakie są efekty realizacji projektu. Dla projektów, które są w trakcie realizacji, wartości poszczególnych wskaźników produktu na koniec roku 2018 zostaną porównane z wartościami bazowymi, co pozwoli opisać występujące tendencje odnośnie poszczególnych wskaźników. Taka analiza pozwala na ocenę skutków prowadzonych działań.

Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawił Burmistrzowi raport z monitoringu, który został skonsultowany z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji oraz Zespołem Konsultacyjnym ds. Rewitalizacji. Po akceptacji raportu, Burmistrz przedstawia go Radzie Miasta Rawa Mazowiecka.

I. Projekty realizowane w ramach LPR Miasta Rawa Mazowiecka w latach 2016-2025 oraz cele programu

1. Lista projektów podstawowych realizowanych w ramach LPRMRM 2025

Projekty podstawowe stanowią istotę działań rewitalizacji, bez realizacji których osiągnięcie celów programu oraz wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej nie byłoby możliwe. W ramach LPRMRM 2025 wskazano 12 projektów podstawowych, w pełni wpisujących się w strategiczne cele i kierunki działań. Poszczególne projekty oddziałują na siebie wzajemnie. Każdy z projektów realizuje przynajmniej dwa z trzech strategicznych celów procesu rewitalizacji, odnosząc się do nich zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.

Lp	Nazwa projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny
2	Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
3	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, b. przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.
4	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni
5	Rawa Gra dla Wszystkich

6	Pomóż Innym i Sobie
7	W „Tęczowej Jedyńce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy
8	Rawscy Skauci jak Zawisza
9	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
10	Bycie EKO Się Oplaca
11	Program Aktywizacja i Integracja
12	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Część projektów już została zrealizowana, inne są w trakcie realizacji, a realizacja projektów: Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji oraz Bycie EKO Się Oplaca, rozpocznie się po 2018 roku.

Poniższa tabela ilustruje komplementarność i logikę pomiędzy projektami podstawowymi a celami i kierunkami działań rewitalizacyjnych.

Nazwa Projektu	Cel Strategiczny 1.				Cel Strategiczny 2.				Cel Strategiczny 3.			
	Kierunki działań											
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	
Rozwój usług wspierania rodziny												
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka												
Rawscy seniorzy sprawni i aktywni												
Rawa gra dla wszystkich												
Pomóż innym i sobie												
W „Tęczowej Jedyńce” zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy												
Rawscy skauci jak Zawisza												
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych												
Bycie EKO się opłaca												
Program aktywizacja i integracja												
Kompleksowy system wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych												
Wykluczamy wykluczenie – wysoka jakość edukacji												

Legenda

 bezpośrednie powiązanie

 pośrednie powiązanie

Cele rewitalizacji i kierunki działań

Cel strategiczny 1 – Poprawa jakości życia i wzmacnianie kapitału społecznego

Strategiczne kierunki działania:

- 1.1- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- 1.2- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- 1.3- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- 1.4- Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel strategiczny 2 – Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego

Strategiczne kierunki działania:

- 2.1- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych
- 2.2- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury
- 2.3- Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych
- 2.4- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Cel strategiczny 3 – Budowanie kapitału ludzkiego i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego

Strategiczne kierunki działania:

- 3.1- Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej
- 3.2- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in.. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- 3.3- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in.. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Projekty zakończone

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Cele projektu
1	Rozwój Usług Wspierania Rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej	Poprawa jakości życia i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez pomoc rodzinom wykazującym bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
2	W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy	Przedszkole Miejskie nr 1 w Rawie Mazowieckiej	Działania proekologiczne zakładające poznanie ekosystemów i kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
3	Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Główny cel to zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywności społecznej osób starszych

4	Rawa Gra dla Wszystkich	Stowarzyszenie TOPORY	Główny cel to aktywizacja społeczna i budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
5	Pomóż Innym i Sobie	Fundacja „Obudźmy Nadzieję”	Główny cel to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocja idei wolontariatu
6	Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	Główny cel to wzrost aktywności oraz profesjonalizacja działań rawskich organizacji pozarządowych

Projekty w trakcie realizacji

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Cele projektu
1	Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	Główny cel to kompleksowa rewitalizacja, skutkująca wprowadzeniem i przywróceniem na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych
2	Rawscy Skauci jak Zawisza	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”	Główny cel to kształtowanie pozytywnych wartości i postaw wśród młodzieży
3	Projekt Aktywizacja i Integracja	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej	Główny cel to pomoc osobom bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, we właściwym funkcjonowaniu w środowisku społecznym
4	Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka	Główny cel to stworzenie sprzyjających warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla poprawy warunków mieszkaniowych

Projekty, których realizacja rozpocznie się po 2018 roku

Lp	Nazwa projektu	Podmiot realizujący	Cele projektu
1	Wykluczamy Wykluczenie (projekt obecnie	Szkoła Podstawowa nr	Główny cel to podnoszenie kompetencji kluczowych,

	realizowany pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”)	2 w Rawie Mazowieckiej	nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2	Bycie Eko się opłaca	Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin im. bł. E. Bojanowskiego	Głównym celem jest zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży

I.2 Projekty zakończone

1. Rozwój Usług Wspierania Rodziny

Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Jego realizacja zakończyła się w 2017 roku.

Zakres rzeczowy:

Projekt zakładał zastosowanie kompleksowych rozwiązań i nowych metod pomocy, świadczonej przez rodziny wspierające, rodzinom wykazującym bezradność w sprawach wychowawczo-opiekuńczych. Zadania te były realizowane poprzez organizację bloków tematycznych, na które miały się składać treningi budowania relacji rodzinnych i społecznych oraz działania wspierające rozwój dziecka. Dla rodzin wymagających pomocy i dla rodzin wspierających zorganizowano szkolenia. Przez cały czas trwania projektu rodziny były objęte wsparciem psychologa, asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2017 roku	Wartości docelowe
Rozwój Usług Wspierania Rodziny	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoby	0	19	19
	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych	osoby	0	15	15
	Liczba rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych kontraktami socjalnymi	szt.	0	5	5
	Liczba przeprowadzonych godzin treningów grupowych	godziny	0	304	304

UWAGI:

W Raporcie Otwarcia przyjęto wysokość wartości docelowych odzwierciedlającą zarówno realizację zadania jak i trwałość zadania co mogło być podstawą do zniekształcenia wniosków z monitoringu w

obecnym raporcie. Dlatego też w obecnym raporcie dokonano modyfikacji i wysokość wartości docelowych uległa zmianie. Obecnie odzwierciedla wartości tylko dla okresu realizacji zadania. Wartości osiągnięte w wyniku realizacji zadania są jednakowe z wartościami docelowymi, a więc wskaźniki produktu dla tego projektu zostały osiągnięte.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2017 roku	Wartości docelowe
Rozwój Usług Wspierania Rodziny	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (ogółem)	osoby	0	13	13
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły swoje kompetencje społeczne, rodzicielskie i życiowe (ogółem)	osoby	0	7	7
	Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje interpersonalne i nabyły wiedzę na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych (ogółem)	osoby	0	6	6
	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu z obszaru rewitalizacji/zdegradowanego	osoby	0	1	1
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły swoje kompetencje społeczne, rodzicielskie i życiowe z obszaru rewitalizacji/zdegradowanego	osoby	0	2	2
	Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje interpersonalne, rodzicielskie i nabyły wiedzę na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych z obszaru rewitalizacji/zdegradowanego	osoby	0	1	1

UWAGI:

W Raporcie Otwarcia przyjęto wysokość wartości docelowych odzwierciedlającą zarówno realizację jak i trwałość zadania. Wysokość wartości docelowych uległa zmianie i aby pokazać prawidłowość danych obecnie odzwierciedla wartości tylko dla okresu realizacji zadania. Wartości osiągnięte w wyniku realizacji zadania są jednakowe z wartościami docelowymi, a więc wskaźniki rezultatu dla tego projektu zostały osiągnięte. W 2018 roku prowadzono działania wynikające z trwałości projektu.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania

Cele pośrednie:

- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Projekt miał za zadanie poprawę dostępu do usług społecznych wysokiej jakości poprzez poszerzenie oferty skierowanej do rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz podniesienie efektywności rodzin wspierających, dążąc w ten sposób do ograniczenia wykluczenia społecznego wśród uczestników projektu.

Monitoring finansowy:

Rozwój Usług Wspierania Rodziny			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Dotacja z funduszy UE Budżet beneficjenta	160 000,00 zł (bez podziału na źródła finansowania)	112 678,00 zł 19 886,00 zł	112 678,83 zł 19 885,50 zł
Suma	160 000,00 zł	132 564,00 zł	132 564,33 zł

2. W „Tęczywej Jedyne” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy

Projekt był realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Jego realizacja zakończyła się w połowie 2017 roku.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu przeprowadzono działania dotyczące zdrowego żywienia i poznawania ekosystemów. Zorganizowano zajęcia wychowawczo- dydaktyczne o tematyce zdrowego żywienia i tematyce proekologicznej oraz warsztaty kulinarne. Zorganizowano zajęcia terenowe umożliwiające poznanie ekosystemów i miejsc o dużej wartości przyrodniczej. Odbyły się konkursy oraz inne wydarzenia plenerowe nawiązujące tematycznie do przedmiotu projektu.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 1 Piknik ekologiczny

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2017 roku	Wartości docelowe
W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy	Liczba wycieczek, warsztatów oraz zajęć stacjonarnych	szt.	2	4	6
	Liczba konkursów związanych z propagowaniem idei zdrowego żywienia oraz poznawanie ekosystemów	szt.	2	3	5
	Liczba zajęć lekcyjnych, kół ekologicznych, akcji itp. związanych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych przy realizacji projektu	szt.	7	1	8

UWAGI:

Liczba działań proekologicznych opisywanych w poszczególnych wskaźnikach pokrywa się z wartościami docelowymi, a więc w tym przypadku wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2017 roku	Wartości docelowe
W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy	Liczba dzieci z placówki uczestniczących w realizacji projektu	osoby	165	163	165
	Liczba dzieci spoza placówki uczestniczących bezpośrednio w projekcie	osoby	120	120	120
	Liczba dorosłych (rodziców i pracowników placówki) uczestniczących w projekcie	osoby	100	265	365

UWAGI:

W przypadku jednego wskaźnika osiągnięta wartość pokrywa się z wartością docelową, w przypadku dwóch pozostałych wskaźników znacznie ją przekracza. Można więc uznać, że wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte. Również po zakończeniu projektu w przedszkolu były podejmowane działania związane z tematyką ekologii. Odbyły się konkursy, warsztaty, wycieczki i zajęcia terenowe. Zakupiono także pomoce dydaktyczne wzbogacające wiedzę przyrodniczą.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych
- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Cele pośrednie:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego.

Projekt miał na celu budowanie świadomości ekologicznej, odpowiedniego podejścia do środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Oferta edukacyjna przedszkola została rozszerzona o blok tematyczny odpowiadający temu celowi. Realizacja celu miała sprzyjać aktywizacji społecznej i środowiskowej mieszkańców, integracji międzypokoleniowej oraz podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych, w których funkcjonują dzieci i ich rodziny.

Monitoring finansowy:

W „Tęczowej Jedyńeczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet beneficjenta Inne	25 000,00 zł (bez podziału na źródła finansowania)	3 508,00 zł 19 873,00 zł	3 508,00 zł 19 873,00 zł
Suma	25 000,00 zł	23 381,00 zł	23 381,00 zł

3. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego realizacja zakończyła się w 2018 roku.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu prowadzono zajęcia z informatyki i języka angielskiego. W ramach zajęć sportowych odbywały się ćwiczenia typu joga, aerobik, aqua aerobik, fit ball oraz zumba. Podczas warsztatów artystycznych zorganizowano zajęcia z dziedziny malarstwa i rękodzieła, a także „saloniki poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadził także zajęcia aktywizujące, integracyjne oraz warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 2 Miejski Marsz Nordic Walking

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni	Liczba godzin zajęć językowych	godziny	0	200	320
	Liczba godzin zajęć sportowych	godziny	0	440	480
	Liczba godzin zajęć warsztatów artystycznych	godziny	0	380	600
	Liczba zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej	szt.	0	48	60

UWAGI:

Wskaźniki produktu dla tego projektu nie zostały osiągnięte. Poziom ich realizacji jest następujący:

- Liczba godzin zajęć językowych - 62,50%
- Liczba godzin zajęć sportowych - 91,67%
- Liczba godzin zajęć warsztatów artystycznych - 63,33%
- Liczba zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej - 80%.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni	Liczba osób uczestniczących w zajęciach, warsztatach ogółem	osoby	0	202	200
	Liczba osób uczestniczących w zajęciach, warsztatach pochodzących z obszaru rewitalizacji	osoby	0	60	64
	Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III Wiek ogółem	osoby	0	28	32
	Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III Wiek z obszaru rewitalizacji	osoby	0	8	8

UWAGI:

Dwa, spośród czterech wskaźników rezultatu dla tego projektu zostały osiągnięte.

Poziom realizacji dwóch pozostałych jest następujący:

- Liczba osób uczestniczących w zajęciach, warsztatach pochodzących z obszaru rewitalizacji - 93,75%
- Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III Wiek ogółem - 87,50%.

W ramach działań uzupełniających mających na celu aktywizację osób starszych podjęto dodatkowe działania zaradcze. W grudniu 2018 roku został utworzony Dzienny Dom Seniora. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. Odbywają się w niej m.in. zajęcia ruchowe o charakterze usprawniającym oraz zajęcia tematyczne, np. z dziedziny literatury czy muzyki. Organizowane są także wydarzenia okolicznościowe, np. wyjścia do muzeum. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w roku 2018.

W 2018 roku również w siedzibie Fundacji Obudźmy Nadzieję powstał Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych dysponujący 15 miejscami. W programie znalazły się: gimnastyka, rehabilitacja, prace manualne i zajęcia przy komputerze.

W wyniku realizacji projektu i działań uzupełniających dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych

Cele pośrednie:

- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury.

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywności społecznej osób starszych, poprzez poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocję aktywnego i zdrowego życia seniorów. Realizacja projektu zakładała poprawę integracji i samoorganizacji seniorów w środowisku lokalnym, poprawę integracji międzypokoleniowej, a w konsekwencji poprawę jakości życia osób starszych.

Monitoring finansowy:

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Dotacja z funduszy UE	70 000,00 zł	26 380,00 zł	11 000,00 zł
Budżet lokalny	(bez podziału na	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Budżet beneficjenta	źródła	9722,00 zł	7370,00 zł
Inne	finansowania)	0,00 zł	3000,00 zł
Suma	70 000,00 zł	50 102,00 zł	35 370,00 zł

4. Rawa Gra dla Wszystkich

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY. Jego realizacja zakończyła się w 2018 roku.


Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu odbyły się cykle wydarzeń, takich jak np. edycje Rawskiego Dnia Gier „Topogranie”, w trakcie których odbywały się m.in. turnieje gier czy zawody kalamburów. Były to także kolejne gry miejskie, w trakcie których kiluosobowe zespoły rywalizowały między sobą poprzez wykonywanie zadań w przestrzeni miasta. Kolejnym wydarzeniem były warsztaty gier narracyjnych (fabularnych). Tworzenie tych gier było okazją do nauki pracy w zespole, dzielenia się obowiązkami, rozwijania kreatywności i wyobraźni.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 3 Ferie z Toporami

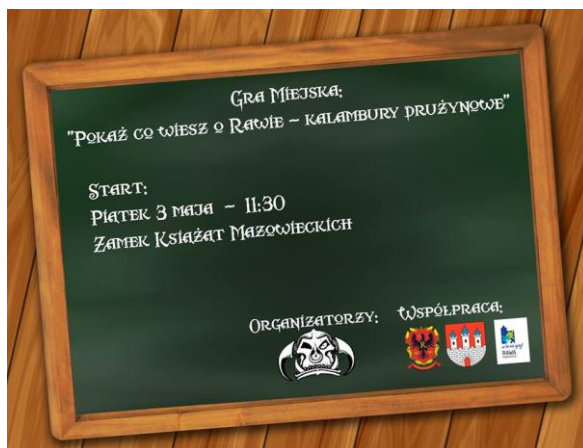

Fot. nr 4 Zaproszenie na grę miejską

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawa Gra dla Wszystkich	Liczba edycji rawskiego dnia gier, konkursów i zabaw skierowanych do najmłodszych mieszkańców Rawy	szt.	0	10	6
	Liczba turniejów/ gier zorganizowanych dla najmłodszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej	szt.	0	8	11

UWAGI:

Wartości osiągnięte dla pierwszego ze wskaźników przekroczyły wartość docelową.

Drugi ze wskaźników produktu został zrealizowany w 72,73%.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawa Gra dla Wszystkich	Liczba uczestników biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach w odniesieniu do jednego spotkania	osoby	0	52	50
	Liczba uczestników biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach całościowo	osoby	0	185	150
	Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	osoby	0	6	6
	Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	osoby	0	18	13

UWAGI:

Ponieważ wartość jednego wskaźnika jest równa, a trzech kolejnych nawet wyższa niż zakładane wartości docelowe, wskaźnik rezultatu dla tego projektu można uznać za osiągnięty. Mimo, że projekt został zakończony, Stowarzyszenie TOPORY nadal organizuje różnego rodzaju gry i konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym na obszarze rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych

Cele pośrednie:

- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury
- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Projekt miał na celu aktywizację społeczną i budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu wydarzeń wykorzystujących różnorodne gry (m.in. miejskie, strategiczne, fabularne, planszowe, zręcznościowe, karciane). Realizacja projektu miała przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej dzieci i młodzieży.

Monitoring finansowy:

Rawa Gra dla Wszystkich			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet lokalny	20 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Dotacja z budżetu państwa	(bez podziału na źródła finansowania)	400,00 zł	400,00 zł
Budżet beneficjenta		13 264,00 zł	23 028,00zł
Suma	20 000,00 zł	43 664,00 zł	53 428,00 zł

5. Pomóż Innym i Sobie

Projekt był realizowany przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Jego realizacja zakończyła się w 2018 roku.

Zakres rzeczowy:

Fundacja Obudźmy Nadzieję prowadziła działalność promującą wolontariat, np. podczas imprez dla mieszkańców miasta. Przedstawiciele fundacji spotykali się z uczniami szkół podstawowych i średnich celem promocji wolontariatu. Zorganizowano także kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 5 Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej



Fot. nr 6 Dzień Wolontariatu

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Pomóż Innym i Sobie	Liczba akcji promocyjnych organizowanych przez fundację	szt.	0	12	12
	Liczba warsztatów/kursów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy i mieszkańców miasta	szt.	0	2	2
	Liczba warsztatów interpersonalnych dla wolontariuszy	szt.	0	9	8

UWAGI:

Wartości dwóch wskaźników były równe, a jednego większa, od wartości docelowych. Wobec tego wskaźnik produktu dla tego projektu można uznać za osiągnięty.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Pomóż Innym i Sobie	Liczba nowych wolontariuszy pozyskanych w ramach realizacji projektu ze wskazaniem ile osób zamieszkuje obszar rewitalizacji	osoby	0	8/2	10/4

UWAGI:

W przypadku liczby nowo pozyskanych wolontariuszy wskaźnik został zrealizowany w 80%.
Jeżeli chodzi o ilość nowych wolontariuszy z obszaru rewitalizacji, to wskaźnik ten został zrealizowany w 50%.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania

Cele pośrednie:

- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych oraz promowanie idei wolontariatu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu miały przyczynić się do integracji społeczności lokalnej i wzmacniania więzi społecznej.

Monitoring finansowy:

Pomóż Innym i Sobie			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet lokalny	20 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł
Budżet beneficjenta	(bez podziału na	7 200,00 zł	12 886,41 zł
Inne	źródła finansowania)	0,00 zł	947,89 zł
Suma	20 000,00 zł	23 200,00 zł	29 834,30 zł

6. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt był realizowany przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka. RCOP ostatecznie otworzono w 2019 roku.

Zakres rzeczowy:

Celem projektu było stworzenie miejsca, w którym organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta i na rzecz mieszkańców, będą mogły działać wspólnie, co przełoży się na wzrost ich aktywności. Placówka została otwarta 11 stycznia 2019 roku i mieści się przy ul. Armii Krajowej 2 w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przystępujących do Centrum, udostępniono nieodpłatnie zaplecze lokalowe wraz z niezbędnym wyposażeniem. W ramach oferty realizowane są specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Projekt jest zgodny z zapisami LPR i został zrealizowany mimo niewielkich opóźnień niż zostało to ujęte w harmonogramie wynikającym z LPR (zakładano utworzenie do końca 2018r.).



Fot. nr 7 Siedziba Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte w 2018 roku	Wartości docelowe
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	szt.	0	0	1
	Powierzchnia wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń pod działalność Centrum	m ²	0	22	60

UWAGI:

Pierwszy wskaźnik produktu został osiągnięty- placówka została utworzona, wyposażona i otwarta. Drugi wskaźnik został zrealizowany w 36,67%. Powierzchnia ta jest mniejsza od zakładanej, ponieważ w zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Natomiast wynajęcie większej powierzchni skutkowałoby wyższymi kosztami z tytułu wynajmu. W razie konieczności przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe będzie nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury. Tak więc powierzchnię dostępną pod działalność centrum można uznać za wystarczającą.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Liczba organizacji pozarządowych działających w ramach Centrum	osoby	0	0	20

UWAGI:

Ponieważ Centrum rozpoczęło działalność w 2019 roku, faktyczna wartość wskaźnika będzie monitorowana od końca 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania

Cele pośrednie:

- Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej
- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenie kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Projekt dotyczący Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ma służyć aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych działających na terenie Rawy Mazowieckiej.

Monitoring finansowy:

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu w okresie objętym raportem	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet beneficjenta	300 000,00 zł (bez podziału na źródła finansowania)	28 500,00 zł	25 430,23 zł
Suma	300 000,00 zł	28 500,00 zł	25 430,23 zł

I. 3. Projekty w trakcie realizacji**1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka**

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt składa się z czterech następujących zadań:

1. Adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej. Planuje się zakończenie zadania w 2019 roku.
2. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Realizację zadania zakończono w 2018 roku.
3. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego. Realizację zadania zakończono w 2018 roku.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Na chwilę obecną dwa zadania- remont muzeum oraz rewaloryzacja parku, zostały zakończone.

Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej
- roboty budowlane, w tym m.in.:
 - a) remont i rozbudowa zabytkowego budynku jatek miejskich
 - b) remont i przebudowa budynku muzeum oraz zagospodarowanie jego otoczenia


- c) prace brukarskie w alejkach, renowacja mostku, nowe nasadzenia, monitoring i plac zabaw,
 - d) nowe nawierzchnie traktów pieszych, nowe zagospodarowanie przestrzeni.
- nadzór inwestorski
 - przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji i źródła dofinansowania z UE.
- Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 8 Jatki. Wizualizacja



Fot. nr 9 Budynek Muzeum Ziemi Rawskiej po remoncie

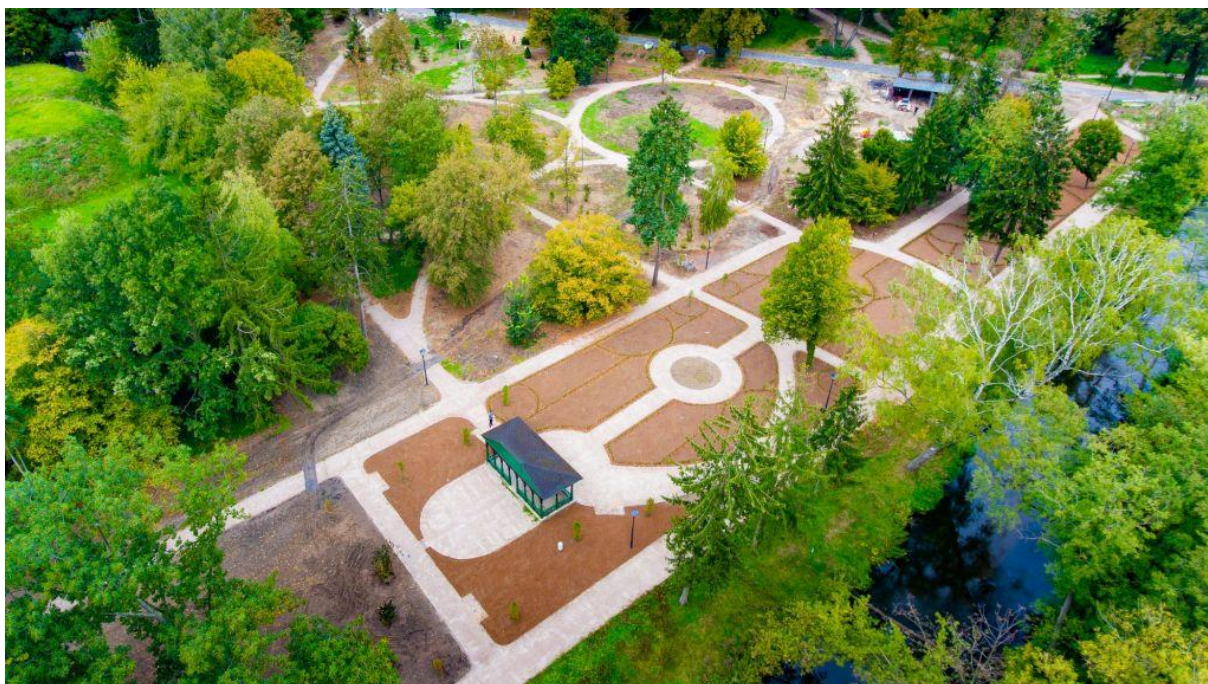

Fot. nr 10 Rewaloryzacja parku miejskiego



Widok z góry na plac marszałka Józefa Piłsudskiego

Fot. nr 11 Wizualizacja Pl. Piłsudskiego

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	0	5,54	8,45
	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	0	1	2
	Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	m ²	0	351,18	907,18
	Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	m ²	0	0	9268
	Długość przebudowanych dróg gminnych	km	0	0,55	1,72
	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	0	2	3

UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczególnych wskaźników był następujący:

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 65,56%
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 50%
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich - 38,71%
- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 0%
- Długość przebudowanych dróg gminnych - 31,98%
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 66,67%.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	szt.	0	0	2
	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni	EPC	0	0	2

UWAGI:

Sytuacja będzie monitorowana do zakończenia realizacji wszystkich zadań składających się na ten projekt.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Poprawa warunków mieszkaniowych
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych

- Zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury
- Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych
- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego
- Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej

Cele pośrednie:

- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania.

Projekt ma na celu kompleksową rewitalizację miasta Rawa Mazowiecka, której wynikiem będzie wprowadzenie oraz przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo- handlową. Realizacja celu wpłynie na ograniczenie niekorzystnych zjawisk o charakterze społecznym oraz zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych. Zaplanowane prace budowlano- remontowe będą uwzględniać zasadę „uniwersalnego projektowania”, co pozwoli dostosować infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Monitoring finansowy:

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Pomoc publiczna	2 942 386,76 zł	1 844 471,30 zł	0,00 zł
Dotacja z funduszy UE	11 699 724,89 zł	2 386 999,80 zł	0,00 zł
Dotacja budżetu państwa	963 506,75 zł	196 576,46 zł	0,00 zł
Budżet beneficjenta	10 537 653,28 zł	2 450 558,10 zł	3 803 042,80 zł
Inne krajowe środki publiczne	2 176 733,23 zł	2 176 733,20 zł	2 197 000,00 zł
Suma	28 320 004,91 zł	9 055 338,80 zł	6 000 042,80 zł

2. Rawscy Skauci jak Zawisza

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Realizacja projektu zakończy się w 2020 roku.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 12 Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2



Fot. nr 13 Jubileuszowa gra niepodległościowa

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawscy Skauci jak Zawisza	Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo	szt.	0	252	504
	Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego	szt.	0	22	32
	Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia	szt.	0	10	20

UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczególnych wskaźników był następujący:

- Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych przez harcerstwo - 50%
- Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku letniego i zimowego - 68,75%
- Liczba imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia - 50%.

Projekt ma być realizowany do końca 2020 roku. Można zakładać, że przebieg projektu jest zgodny z założeniami, ponieważ w połowie okresu, na który został zaplanowany, wskaźniki też są zrealizowane co najmniej w połowie.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Rawscy Skauci jak Zawisza	Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem	osoby	0	650	500
	Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem	osoby	0	29	30
	Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji	osoby	0	1	4

UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczególnych wskaźników był następujący:

- Liczba osób biorących udział w proponowanych przez organizatora zajęciach i grach ogółem - przekroczony o 30%
- Liczba nowych członków Stowarzyszenia ogółem - 96,67%
- Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru rewitalizacji - 25%.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych
- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Cele pośrednie:

- Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej).

Projekt ma na celu propagowanie pozytywnych wartości i kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży. Jego realizacja ma przyczynić się do wzmacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz poprawy dostępu do usług kulturalnych.

Zakres rzeczowy:

Zamierzeniem projektu jest ożywienie przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji poprzez zajęcia edukacyjne, wspólne gry i zabawy, również plenerowe oraz organizację wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. W ramach realizowanych zadań harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” organizują spotkania i zbiórki, a także gry miejskie.

Monitoring finansowy:

Rawscy Skauci jak Zawisza			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet lokalny	20 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
Budżet beneficjenta	(bez podziału na	163 605,00 zł	202 809,18 zł
Inne	źródła finansowania)	27 000,00 zł	0,00 zł
Suma	20 000,00 zł	226 605,00 zł	238 809,18 zł

3. Projekt Aktywizacja i Integracja

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Realizacja projektu zakończy się w 2019 roku.

Zakres rzeczowy:

Program obejmuje dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną. Aktywizacja zawodowa polega na zorganizowaniu prac społecznie użytecznych. Są one realizowane w jednostkach należących do Miasta. Drugi blok to integracja społeczna, która obejmuje cykl zajęć warsztatowych i integracyjnych m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia są prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego.

Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2017 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Projekt Aktywizacja i Integracja	Liczba godzin przepracowanych w formie prac społecznie użytecznych (blok aktywizacja)	godziny	0	760	800
	Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz warsztatów trenerskich z doradcą zawodowym	godziny	0	760	800

UWAGI:

Na koniec 2018 roku stopień realizacji obu wskaźników produktu był taki sam i wyniósł 95%.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2017 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Projekt Aktywizacja i Integracja	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoby	0	0	2
	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	0	9	12
	Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po opuszczeniu programu: a. uzyskały kwalifikacje, b. podjęły pracę lub ją kontynuowały	osoby	0	a. 4 b. 0	a. 4 b. 4

UWAGI:

Na koniec 2018 roku poziom realizacji poszczególnych wskaźników był następujący:

- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 0%
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 75%
- Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po opuszczeniu programu uzyskały kwalifikacje - 100%
- Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub ją kontynuowały - 0%.

Projekt będzie realizowany również w 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej
- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej)

Cele pośrednie:

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, najbardziej oddalonych od rynku pracy. Program był realizowany w maju i czerwcu ubiegłego roku, do udziału w którym zakwalifikowano również 10 osób.

Monitoring finansowy:

Projekt Aktywizacja i Integracja			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet beneficjenta	20 000,00 zł	5 391,39 zł	5 391,39 zł
Inne	(bez podziału na źródła finansowania)	3 688,20 zł	3 688,20 zł
Suma	20 000,00 zł	9 079,59 zł	9 079,59 zł

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu zostało wykonane opracowanie pn. „Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobów Mieszkaniowych”. Dokument ma ułatwić wdrożenie projektu w mieście Rawa Mazowiecka. Zasadniczym celem opracowania jest diagnoza warunków mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobór rozwiązań i instrumentów, które pomogą uruchomić proces odnowy zasobów mieszkaniowych. Diagnoza daje podstawę do stworzenia rozwiązań przeznaczonych dla różnych grup społecznych: prywatnych właścicieli, wspólnot mieszkaniowych oraz najemców zasobów komunalnych. Projekt jest zgodny z zapisami LPR i jest realizowany zgodnie z harmonogramem.



Fot. nr 14 Konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy dotychczasowych praktyk i kierunków działania zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych	szt.	0	1	2
	Liczba konsultacji społecznych mających na celu poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia	szt.	0	0	3
	Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego	szt.	0	0	2

UWAGI:

Pierwszy ze wskaźników, dotyczący przygotowania diagnozy, został zrealizowany w 50%. Pozostałe nie zostały zrealizowane. Można zakładać, że ich wartości ulegną zmianie, ponieważ zakres rzeczowy projektu będzie realizowany do końca 2019 roku. W 2019 roku zostanie przedstawiony poradnik dla mieszkańców a także dwa instrumenty, które pomogą w procesie odnowy zasobów mieszkaniowych, czyli konkurs na elewacje oraz dofinansowanie z budżetu miasta na roboty budowlane przy zabrytkach. Projekt będzie wdrażany od 2020 roku.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych	Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z instrumentów wsparcia finansowego i organizacyjnego	szt.	0	0	3

UWAGI:

Na chwilę obecną wskaźnik nie został zrealizowany. Można zakładać, że wartości wskaźników ulegną zmianie, ponieważ wskaźniki rezultatu będą monitorowane do 2025 roku. W 2019 roku zostanie przedstawiony poradnik dla mieszkańców a także instrumenty, które pomogą w procesie odnowy zasobów mieszkaniowych. Projekt będzie wdrażany od 2020 roku.

W wyniku realizacji projektu dążono do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich i pośrednich:

- Poprawa warunków mieszkaniowych

Cel pośredni:

- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie systemu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

Monitoring finansowy:

Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych			
Źródła finansowania	Planowane koszty realizacji projektu w oparciu o szacunek wynikający z LPR	Planowane koszty realizacji projektu	Rzeczywiste koszty realizacji projektu
Budżet beneficjenta	50 000,00 zł (bez podziału na źródła finansowania)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Suma	50 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł

I.4. Projekty, których realizacja rozpocznie się po 2018 roku

1. Wykluczamy Wykluczenie - projekt będzie realizowany pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów-rozwoj kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”

Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku. Jego realizacja nie jest zgodna z harmonogramem. W celu dostosowania zapisów LPR dotyczących projektu do reformy edukacji zakładającej stopniowe wygaszanie gimnazjów, wystąpiono do instytucji zarządzającej, jaką jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, o wyrażenie zgody na modyfikację projektu. Po otrzymaniu zgody, projekt pod nazwą „Wykluczamy Wykluczenie - wysoka jakość edukacji w Gimnazjum nr 1 i nr 2” został zmodyfikowany. Obecnie jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów-rozwoj kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.

Zakres rzeczowy:

W ramach realizacji projektu zaplanowano prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości, a także zapewnienie wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Ważnym elementem są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe i cyfrowe uczniów rawskiej „dwójki”.

Wskaźniki produktu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
„Szkoła twórczych umysłów-rozwoj kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	osoby	0	0	288
	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie	szt.	0	0	1
	Liczba szkół i placówek systemu	szt.	0	0	1

w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych				
	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie	osoby	0	0	6
	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoby	0	0	60
	Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których minimum 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne	szt.	0	0	1
	Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości	osoby	0	0	40
	Liczba uczniów objętych indywidualizacją pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	osoby	0	0	145
	Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie miast średnich	szt.	0	0	1

UWAGI:

Wskaźniki produktu i ich wartości docelowe zostały zmienione w stosunku do Raportu Otwarcia LPR w związku z dostosowaniem projektu do reformy edukacji i złożeniem nowego wniosku. Wartości wskaźników będą monitorowane na etapie realizacji, która rozpocznie się w 2019 roku.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości bazowe 2016 rok	Wartości osiągnięte na koniec 2018 roku	Wartości docelowe
„Szkola twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoby	0	0	230
	Liczba szkół, w których pracownice przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.	0	0	1
	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	szt.	0	0	1
	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli	osoby	0	0	48

	kompetencje po opuszczeniu programu				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

UWAGI:

Niektóre wskaźniki rezultatu i wszystkie wartości docelowe zostały zmienione w stosunku do Raportu Otwarcia LPR w związku z dostosowaniem projektu do reformy edukacji i wdrażaniem projektu pod inną nazwą przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Wartości wskaźników będą monitorowane na etapie realizacji, która rozpoczęła się w 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następującego celu bezpośredniego:

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych (opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury i administracji publicznej)

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów pośrednich:

- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego
- Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej
- Tworzenie warunków do aktywizacji i zatrudniania osób bezrobotnych, m.in. osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
- Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej (m.in. mobilności przestrzennej i sektorowej).

Zakładany nakład finansowy:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 1 154 673,02 zł. Wkład własny beneficjenta wynosi 103 334,00 zł.

2. Bycie Eko się opłaca

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

Głównym celem jest zwiększenie świadomości proekologicznej oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowym elementem projektu jest promocja aktywnego i efektywnego spędzania czasu.

Zakres rzeczowy:

W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów służących nadaniu przedmiotom nowej formy a następnie pokaz tych przedmiotów w przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. Planuje się także animacje, konkursy oraz warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej, a także warsztaty efektywnego zarządzania czasem dla dzieci i młodzieży.

W wyniku realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:

- Integracja społeczna i ograniczanie wykluczenia społecznego
- Wzmacnianie więzi społecznych, współpracy i zaufania
- Zapewnienie ładu przestrzennego oraz zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych
- Wzmacnianie walorów przyrodniczych i kulturowych
- Wspieranie zasobooszczędnego gospodarowania oraz ochrona środowiska przyrodniczego.

Zakładany nakład finansowy:

Szacowana wartość projektu to 50 000,00 zł.

II. Monitoring procesów zachodzących na obszarze rewitalizacji i w mieście.

Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji i dla obszaru całego miasta

W ramach monitorowania procesu rewitalizacji są zbierane i przetwarzane dane jakościowe i ilościowe podzielone na dwa poziomy: dla obszaru rewitalizacji oraz dla obszaru całego miasta w określonych sferach. Obie grupy wskaźników są powiązane z cechami obszaru, którego dotyczą oraz z celami rewitalizacji, których osiągnięcie ma nastąpić poprzez realizację przedsięwzięć

rewitalizacyjnych. Na podstawie obserwacji zmian zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, możemy ocenić postępy wdrażania programu oraz planować przyszłe działania w oparciu o skutki działań już zrealizowanych. W oparciu o wskaźniki można obserwować przebieg procesów w poszczególnych sferach a na podstawie zmian zachodzących w poszczególnych obszarach, można aktualizować zapisy Programu w celu dostosowania do zaistniałych potrzeb.

II.1. Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji

Poniższa tabela przedstawia tendencje dotyczące poszczególnych wskaźników dla obszaru rewitalizacji. Dane pochodzą ze statystyki publicznej, od miejskich i powiatowych jednostek samorządowych oraz od organizacji pozarządowych i są ujęte w zestaw wskaźników.

Wskaźniki dla obszaru rewitalizacji	Jednostka miary	Wartość bazowa 2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Liczba popełnionych przestępstw	Sztuka	31	65	Ulice znajdujące się w całości na obszarze rewitalizacji	23
				Ulice znajdujące się częściowo na obszarze rewitalizacji	61
Liczba popełnionych wykroczeń	Ulice znajdujące się w całości na obszarze rewitalizacji	48	40	43	
	Ulice znajdujące się częściowo na obszarze rewitalizacji	111	104	88	
Liczba osób bezrobotnych	osoba	51	53	51	
Liczba osób długotrwale bezrobotnych	osoba	38	32	24	
Liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeniach publicznych	sztuka	85	54	106	
Liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego	sztuka	4	4	9	
Liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu	sztuka	0	0	1	

obywatelskiego przez inicjatorów z obszaru rewitalizacji				
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej	świadczeniobiorca	133	122	111
	łącznie liczba osób w rodzinach	187	194	135
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	0,55	6,04	5,62
Liczba wspartych obiektów infrastruktury	sztuka	8	2	2
Rekultywowana przestrzeń otwarta (tereny zieleni)	ha	0	0	0,4
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	sztuka	0	1	0
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	sztuka	0	1	2
Liczba osób uczestniczących w zajęciach z edukacji ekologicznej	osoba	302	465	792
Liczba członków organizacji pozarządowych	osoba	247	212	152
Liczba wolontariuszy w organizacjach pozarządowych	osoba	34	18	33
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły swoje kompetencje (społeczne, rodzicielskie lub życiowe)	osoba	0	2	4
Liczba ulokowanych przedsiębiorstw	sztuka	16	0	21
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	m ²	0	124,25	18
Powierzchnia objęta nadzorem wizyjnym	ha	0	0	5,5

(monitoringiem)				
Liczba osób uczestniczących w zajęciach (warsztatach, szkoleniach, itp.)podnoszących kompetencje zawodowe	Osoby które podniosły swoje kompetencje zawodowe	8	59	97
	Osoby które po podniesieniu kompetencji uzyskały zatrudnienie lub awans	8	11	8

Analizując przedstawione wskaźniki za okres od 2016 do 2018 roku, gdzie wartością bazową jest rok 2016, można zauważyć następujące zjawiska.

Odnotowano spadek osób długotrwale bezrobotnych przy nie zmienionej ilości osób bezrobotnych ogółem (pomimo wzrostu tej wartości w 2017r.), co może sugerować zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej wśród mieszkańców i podniesienie kompetencji osób w poszczególnych profilach. Na koniec 2018 roku nastąpił też spadek liczby osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej dla świadczeniobiorców (pomimo wzrostu wartości odnośnie liczby osób w rodzinach w 2017roku). Wahania te mogły być spowodowane np. zmianą struktury w rodzinach.

W odniesieniu do wskaźników, w stosunku do których oczekuje się, aby tendencja była rosnąca, osiem wskaźników charakteryzuje się trwałą tendencją wzrostową. W stosunku do sześciu wskaźników odnotowano wahania w poszczególnych latach, natomiast trzy wskaźniki odnotowały spadek w stosunku do wartości bazowej z 2016 roku.

Spadek dotyczył m.in. liczby członków organizacji pozarządowych i liczby wolontariuszy. Wskaźnik ten został ustalony w oparciu o dane przesłane przez organizacje pozarządowe mające siedzibę/oddział na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Prośbę o informacje za rok 2017 wysłano do 56 organizacji. 33 z nich nie podały danych, 4 dostarczyły dane niepełne. Za rok 2018 odpowiednio: wysłane 55, brak danych 37, niepełne dane 2.

Pomimo tendencji spadkowej dotyczącej liczby wspartych obiektów infrastruktury, w okresie 2017-2018 udało się wesprzeć 4 obiekty. Jeżeli chodzi o liczbę zabytków nieruchomości objętych wsparciem, to wahania wskaźników w poszczególnych latach są naturalnym zjawiskiem uzależnionym od szeregu czynników, np. zakończenie działań przy jednym zabytku i rozpoczęcie prac przy drugim. Wieloletni proces realizacji prac przy obiekcie zabytkowym sugeruje, iż wskaźnik ten nie powinien być rozpatrywany tylko w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego.

W oparciu o powyższą tabelę wskaźnik, dotyczący liczby przestępstw, można analizować tylko w odniesieniu do roku 2017, w którym nastąpił jego znaczący wzrost. System stosowany obecnie przez policję uniemożliwia uzyskanie danych za 2018 rok o wystarczającej szczegółowości, a więc danych dla poszczególnych numerów posesji na ulicach, które pozwoliłyby ustalić stan wskaźnika ściśle na obszarze rewitalizacji. Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji będzie możliwy do określenia za 2019 rok ze względu na zmianę systemu przyjmowania zgłoszeń stosowanym przez policję.

Jeżeli chodzi o rejestr wykroczeń, to wyszczególnienie tego wskaźnika tylko dla obszaru rewitalizacji także nie jest możliwe. Ilość wykroczeń została podana dla całych ulic, nawet gdy w obszarze rewitalizacji znajduje się tylko część ulicy. Wskaźnik został przygotowany w oparciu o liczbę wykroczeń zarejestrowanych w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenie podaną przez Komendę Powiatową Policji. W bazie tej są ujęte wykroczenia, które zostały skierowane na drogę sądową. Można zaobserwować stały spadek ilości popełnianych wykroczeń. Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji będzie możliwy do określenia za 2019 rok ze względu na kolejną zmianę w systemie stosowanym przez policję.

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym w dużej mierze wykazują właściwy i zgodny z założeniami kierunek zmian w dążeniu do osiągnięcia celów zakładanych w LPR.

II.2. Wskaźniki dla miasta ogółem

Wskaźniki dla miasta ogółem zostały podzielone na trzy grupy, tj. dotyczące sfery gospodarczej, sfery społecznej oraz sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz środowiskowej.

Sfera gospodarcza

Wskaźniki dla miasta ogółem	Jednostka miary	Wartość bazowa 2016 rok	2017 rok	2018 rok
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców	osoba	940	950	966
Liczba jednostek nowo-zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 000 mieszkańców	sztuka	73	90	90
Liczba podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym	sztuka	25	26	22
Liczba przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki WG PKD 2007 (Sekcja I – Zakwaterowanie i Gastronomia	sztuka	50	48	51
Liczba przedsiębiorstw działających w sektorze kultury WG PKD 2007	sztuka	25	25	25
Liczba całorocznych miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1000 mieszkańców	sztuka	15,4	15,3	15,5
Długość dróg rowerowych	km	8	8	wzrost o 4,9

Środki finansowe w budżecie miasta Rawa Mazowiecka pozyskane z zewnętrznych źródeł (dotacje, subwencje, krajowe, EFRR, EFS, EOG, itp.)	PLN	28 734 921	31 962 661,99	37 342 434,84
Środki finansowe w budżecie miasta Rawa Mazowiecka pozyskane z zewnętrznych źródeł na 1 mieszkańca	PLN	1 638,81	1828,53	2 136,29

Najważniejsze wnioski dotyczące tej sfery:

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że w przypadku większości wskaźników dotyczących sfery gospodarczej odnotowano wzrost, szczególnie istotny w przypadku jednostek nowo rejestrowanych w systemie REGON. Biorąc powyższe pod uwagę można mówić o tendencji wzrostowej dotyczącej przedsiębiorczości mieszkańców miasta. W związku z istotnym wzrostem środków finansowych pozyskanych przez miasto można domniemywać, że pracownicy organów miejskich wykazują coraz większą sprawność w pozyskiwaniu takich środków. Stwarza to możliwość dalszego rozwoju miasta, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w innych dziedzinach istotnych dla jego rozwoju.

Sfera społeczna

Wskaźniki dla miasta ogółem	Jednostka miary	Wartość bazowa 2016 rok	2017 rok	2018 rok
Saldo migracji	osoba	-63	- 127	-96
Udział Osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem	%	4,85	4,24	3,78
Kwota świadczeń publicznych z tytułu pomocy społecznej ogółem	PLN	1 646 259	1 699 409	1 602 583
Kwota świadczeń publicznych z tytułu pomocy społecznej na osobę	PLN na świadczeniobiorców	2 868	3 365,17	3 476,32
	PLN na liczbę osób w rodzinach	1 928	2 265,88	2 417,17

Dochody gminy na 1 mieszkańca	PLN	3 994,28	4 235,98	4 891,65
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	5,5	5,0	brak danych za 2018 rok
Odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem	%	16,27	14,70	14,66
Odsetek bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem	%	25,50	26,51	26,72
Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem	%	47,39	46,72	49,14
Liczba osób długotrwale bezrobotnych wg wieku	osoba	498	178	171
w wieku 18-24		51	5	6
w wieku 25-34		129	42	40
w wieku 35-44		121	44	52
w wieku 45-54		86	45	29
w wieku 55-59		70	25	23
w wieku 60-64		41	17	21
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym	%	91,09	87,54	99,27
Współczynnik skolaryzacji brutto	% szkoły podstawowe	116,46	117,12	116,70
	% gimnazja	136,56	138,83	142,28
Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców	sztuka	4,38	5,08	4,5
Liczba niebieskich kart na terenie miasta	aktywnych na koniec roku	25	12	13
	wydanych w ciągu roku	33	29	33

Liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	osoba	1216	1139	1091
Odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wyższym wykształceniem w liczbie ludności w tym wieku ogółem	%	brak danych, dane pozyskiwane tylko przy spisach społecznych	brak danych, dane pozyskiwane tylko przy spisach społecznych	brak danych, dane pozyskiwane tylko przy spisach społecznych
Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców (bez stomatologów, wg podstawowego miejsca pracy)	osoba	50,76	39,37	40,09
Liczba uczestników imprez organizowanych przez domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice na 1000 mieszkańców	osoba	1160,50	967	1200
Frekwencja w wyborach do organów JST	%	brak ogłoszonych wyborów samorządowych	brak ogłoszonych wyborów samorządowych	sejmiki województw: 52,94, rady powiatów: 53,43, rady gmin i rady miast w miastach na prawach powiatu: 53,42, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast- I tura wyborów: 53,47, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast- II tura: 49,26

Liczba organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne) na 10 000 mieszkańców	sztuka	32	34	34
Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych w liczbie podatników ogółem	%	39	41	51,40
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców	sztuka	31,71	20,71	22,39
Liczba wykroczeń na 1000 mieszkańców	sztuka	25,11	20,42	17,68

Najważniejsze wnioski dotyczące tej sfery:

Bardzo pozytywnym sygnałem jest znaczny wzrost dochodów gminy na 1 mieszkańca, który może zaowocować rozwojem miasta. Korzystny jest także znaczny wzrost liczby osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych, co może świadczyć o częstszym występowaniu postaw obywatelskich. Pozytywnym czynnikiem wydaje się także być spadek stopy bezrobocia oraz bardzo znaczący spadek ilości osób długotrwale bezrobotnych, a także spadek udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Powyższe dane wskazują na zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej wśród mieszkańców.

Bardzo korzystny wydaje się także spadek liczby przestępstw i wykroczeń w mieście. O ile pozytywnym jest spadek, w porównaniu do roku bazowego 2016, liczby aktywnych niebieskich kart na terenie miasta, o tyle niepokojące jest, że liczba kart wydanych w ciągu roku, w odniesieniu do poszczególnych lat, nie zmniejsza się (wyjątkiem jest rok 2017). Sugeruje się zwrócenie większej uwagi na rodziny z problemami.

Mimo wzrostu współczynnika skolaryzacji brutto oraz wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, niekorzystnym wydaje się być systematyczny spadek liczby uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. Dlatego sugeruje się położenie większego nacisku na realizację projektów służących podnoszeniu kompetencji uczniów, korzystając jednocześnie ze środków zewnętrznych.

Niepokojącym jest również spadek liczby lekarzy na 10 000 mieszkańców, co może sugerować, iż w mieście nie istnieje wystarczająca infrastruktura związana ze służbą zdrowia, która pozwalałaby na zatrudnienie większej liczby lekarzy. Zaleca się podjęcie działań zmierzających do poprawy infrastruktury medycznej w mieście.

Znaczący wzrost salda migracji wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.

Jeden ze wskaźników, mianowicie odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wyższym wykształceniem w liczbie ludności w tym wieku ogółem, nie jest możliwy do monitorowania z uwagi na to, że dane pozyskiwane są tylko przy spisach społecznych. Dlatego rekomenduje się wyłączenie tego wskaźnika z monitoringu.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna oraz środowiskowa

Wskaźniki dla miasta ogółem	Jednostka miary	Wartość bazowa 2016 rok	2017 rok	2018 rok
Lesistość miasta	%	4,77	4,77	4,77
Liczba Ludności korzystającej z sieci wodociągowej do liczby mieszkańców ogółem	%	92,3	92,4	92,5
Liczba ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej do liczby mieszkańców ogółem	%	87,2	87,4	87,6
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków do liczby mieszkańców ogółem	%	94,70	96	97,3
Liczba ludności korzystającej z instalacji gazowej do liczby mieszkańców ogółem	%	71,2	71	74,4
Udział dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w ogólnej długości tych dróg	%	15,29	15,29	12,84
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) ogółem	%	42,40	30,7	23,87
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (pyłowe i gazowe)	T/R	3412 dane dla powiatu	3743 dane dla powiatu	3687
Udział powierzchni miasta objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni miasta ogółem	%	100	100	100
Liczba wydanych pozwoleń na budowę (budynki mieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania oraz niemieszkalne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	sztuka	94	159	54

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych	ha, całkowicie uzbrojone	0	0	0
	ha, częściowo uzbrojone	31	70	70
Udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta	%	2,8	2,8	2,8
Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku	sztuka	53	50	49
Liczba nowych mieszkań komunalnych/socjalnych	sztuka	5	3	42
Liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie socjalne	sztuka	199	210	218

Najważniejsze wnioski dotyczące tej sfery:

W tej sferze najbardziej znaczący wzrost został odnotowany dla wartości wskaźnika opisującego liczbę nowych mieszkań komunalnych/socjalnych, która wzrosła aż czternastokrotnie w porównaniu do roku bazowego 2016. Budowa nowych mieszkań socjalnych jest sprawą istotną z uwagi na jednoczesny wzrost liczby gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie socjalne. Rekomenduje się weryfikację deklaracji osób oczekujących na mieszkanie socjalne, w celu określenia faktycznych potrzeb i ilości osób wnioskujących o taki lokal. Wzrost liczby gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie socjalne oraz spadek liczby innych nowych mieszkań oddanych do użytku, a także spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę sugeruje, że nie są jeszcze zaspokojone wszystkie potrzeby mieszkaniowe w mieście.

Należy także odnotować istotny wzrost dotyczący powierzchni częściowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz zmniejszenie udziału dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w długości dróg ogółem, a także niewielki ale systematyczny wzrost liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz z oczyszczalni ścieków. Świadczy to o coraz większym uporządkowaniu terenów w mieście, co stwarza możliwości wzrostu atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Negatywnym sygnałem jest spadek ilości odpadów poddanych odzyskowi. Dlatego sugeruje się położenie większego nacisku na działania związane z segregowaniem i recyklingiem odpadów, m. in. korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Wprawdzie wskaźnik emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (pyłowe i gazowe) nie jest możliwy do porównania, ponieważ dane przesyłane przez Urząd Statystyczny są najpierw podawane dla powiatu a za 2018 rok dla miasta, jednak wiadomo, że miasto Rawa Mazowiecka należy do grona miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego podejmowane są działania mające na celu poprawę tego stanu.

Podsumowanie

Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka, która jest procesem długoterminowym, zakłada realizację 12 podstawowych projektów rewitalizacyjnych wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Działania podejmowane podczas ich realizacji były skierowane do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zarówno z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego. Ich adresatami były osoby ze wszystkich grup wiekowych. W Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 zostały określone wskaźniki produktu i rezultatu dla każdego z 12 projektów podstawowych wraz z określeniem wartości bazowych i docelowych. W niniejszym raporcie przedstawiono stopień osiągnięcia poszczególnych wskaźników podczas realizacji projektów. Większość wskaźników produktu i rezultatu dla tych projektów została osiągnięta, co pokazuje, że instytucje realizowały projekty w sposób prawidłowy i dążono do realizacji celów.

W przypadku projektu „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte tylko częściowo. Dlatego podjęto działania zaradcze mające na celu aktywizację osób starszych. W tym celu utworzono placówkę Dzienny Dom Seniora oraz realizowano inne działania miękkie stanowiące uzupełnienie w drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Także wskaźnik rezultatu związany z liczbą nowo pozyskanych wolontariuszy został osiągnięty tylko częściowo. Może to wskazywać na występowanie trudności w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy biorących udział w działaniach społecznych. Dlatego rekomenduje się wspieranie wszelkiego rodzaju działań mających na celu promowanie wolontariatu.

W ramach monitorowania procesu rewitalizacji są także zbierane i przetwarzane dane jakościowe i ilościowe dotyczące obszaru rewitalizacji oraz obszaru całego miasta. Wskaźniki te są powiązane z celami rewitalizacji. Na ich podstawie można uaktualnić zapisy Programu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Wartości wskaźników dla obszaru rewitalizacji generalnie wykazują właściwy i zgodny z założeniami LPR kierunek zmian.

Wskaźniki dla obszaru całego miasta zostały podzielone na trzy grupy dotyczące poszczególnych sfer - gospodarczej, społecznej, a także przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, to w większości wskaźników odnotowano wzrost sugerujący zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

W sferze społecznej rekomenduje się zwrócenie większej uwagi i przygotowanie ewentualnej pomocy dla rodzin z problemami skutkującymi wydaniem niebieskiej karty. Większy nacisk powinien być też położony na realizację projektów służących podnoszeniu kompetencji uczniów, a także na działania zmierzające do poprawy infrastruktury medycznej w mieście.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej najpilniejszą potrzebą wydaje się być niedostateczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, zintensyfikowanie działań związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów, a także działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Podsumowując można stwierdzić, że zmiany dokonujące się w mieście na skutek realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji są zmianami zmierzającymi w dobrym kierunku. Jednakże znaczący wzrost salda migracji wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Rawy Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania.
